


# Nyomáspróba Jegyzőkönyv

## Nyomáspróba vizsgálat folyamatábra


### Előzetes vizsgálat

Üzemi nyomás  
18 bar

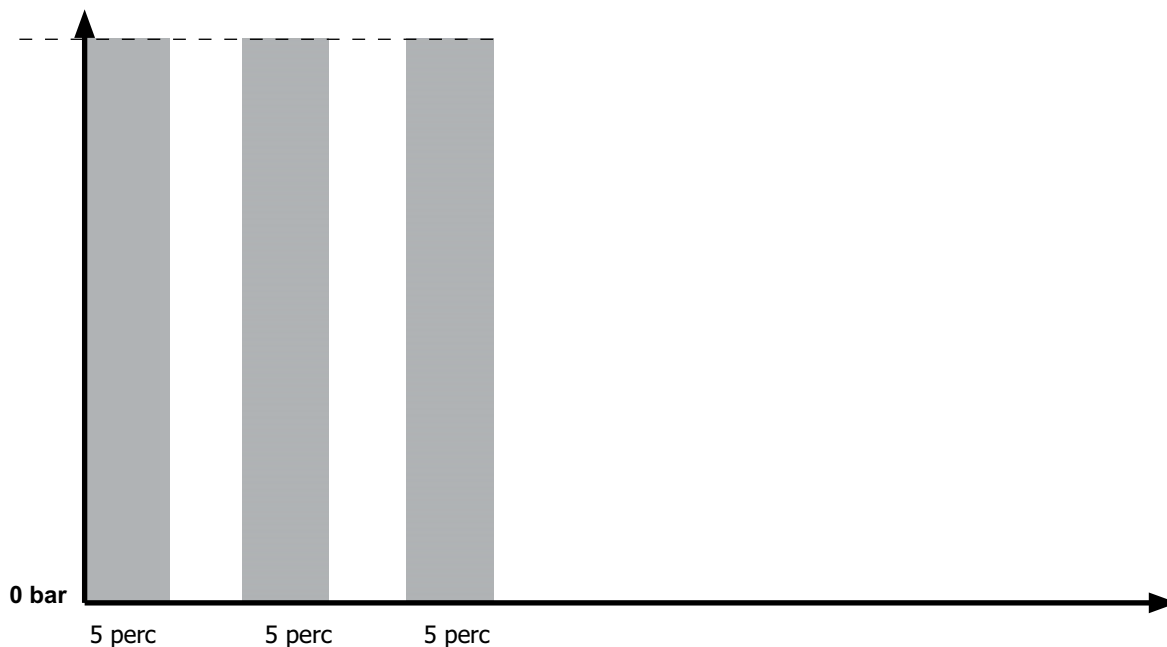

### Fő és végső ellenőrzés

Üzemi nyomás  
10 bar

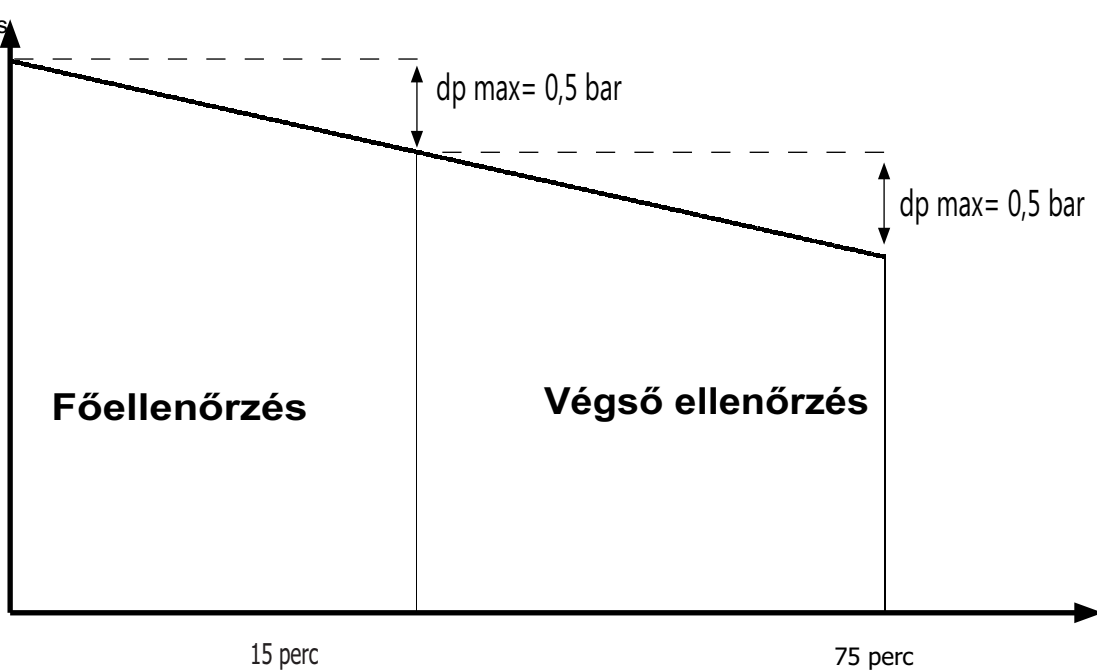

# Nyomáspróba vizsgálati jegyzőkönyv

Beépítés helye: \_\_\_\_\_

Munka megnevezése: \_\_\_\_\_

## Előzetes vizsgálat:

3 x 5 perc 18 bar nyomáson, a csövek tágulása és zsugorodása miatt szükséges.

## Előzetes vizsgálat

Minden ciklus után a nyomást le kell engedni.

18 bar	5 perc	elvégezve:	igen	nem
18 bar	5 perc	elvégezve:	igen	nem
18 bar	5 perc	elvégezve:	igen	nem

## Főellenőrzés

Vizsgálati nyomás: 10 bar

Nyomáscsökkenés 15 perc után: \_\_\_\_\_ bar **max. 0,5 bar**

## Végső ellenőrzés

(Közvetlenül a főellenőrzés után, a nyomás változtatása nélkül)

Főellenőrzés eredménye : \_\_\_\_\_ bar

Nyomáscsökkenés 60 perc után: \_\_\_\_\_ bar **max. 0,5 bar**

Megjegyzés: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hely \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pecset/aláírás

**Beépítés leírása:**

Helyszín: \_\_\_\_\_

Munka terület: \_\_\_\_\_

**cső mennyiség:**

Ø 20 mm _____	m	Ø 160 mm _____	m
Ø 25 mm _____	m	Ø 200 mm _____	m
Ø 32 mm _____	m	Ø 250 mm _____	m
Ø 40 mm _____	m	Ø 315 mm _____	m
Ø 50 mm _____	m	Ø 355 mm _____	m
Ø 63 mm _____	m	Ø 400 mm _____	m
Ø 75 mm _____	m	Ø 450 mm _____	m
Ø 90 mm _____	m	Ø 500 mm _____	m
Ø 125 mm _____	m	Ø 560 mm _____	m
		Ø 630 mm _____	m

Nyomáspróba kezdete: \_\_\_\_\_

Nyomáspróba vége: \_\_\_\_\_

Nyomáspróba időtartama: \_\_\_\_\_

Közeg:                   Víz                   Vízr/Glikol

Ügyfél: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kivitelező: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hely: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Pecset/aláírás**
